# EAP, Cronograma e Distribuição de Responsabilidades

Planejamento do projeto, da entrega A1 (20/10/2026) à entrega A3 (01/12/2026)

| Campo | Informação |
|---|---|
| Projeto | Sistema de Folha de Pagamento — Mercadinho Fapa |
| Disciplina | Garantia da Qualidade de Software — Trabalho Integrador (A1 e A3) |
| Equipe | Guilherme Belotto, Kauã e Leonardo Trinca |
| Data | 20/10/2026 |
| Versão | 1.0 |

**Histórico de revisões**

| Versão | Data | Descrição | Responsáveis |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/10/2026 | Versão inicial para a entrega A1. | Equipe |

# 1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP divide o projeto em pacotes de trabalho. A numeração é usada no cronograma e na distribuição de responsabilidades.

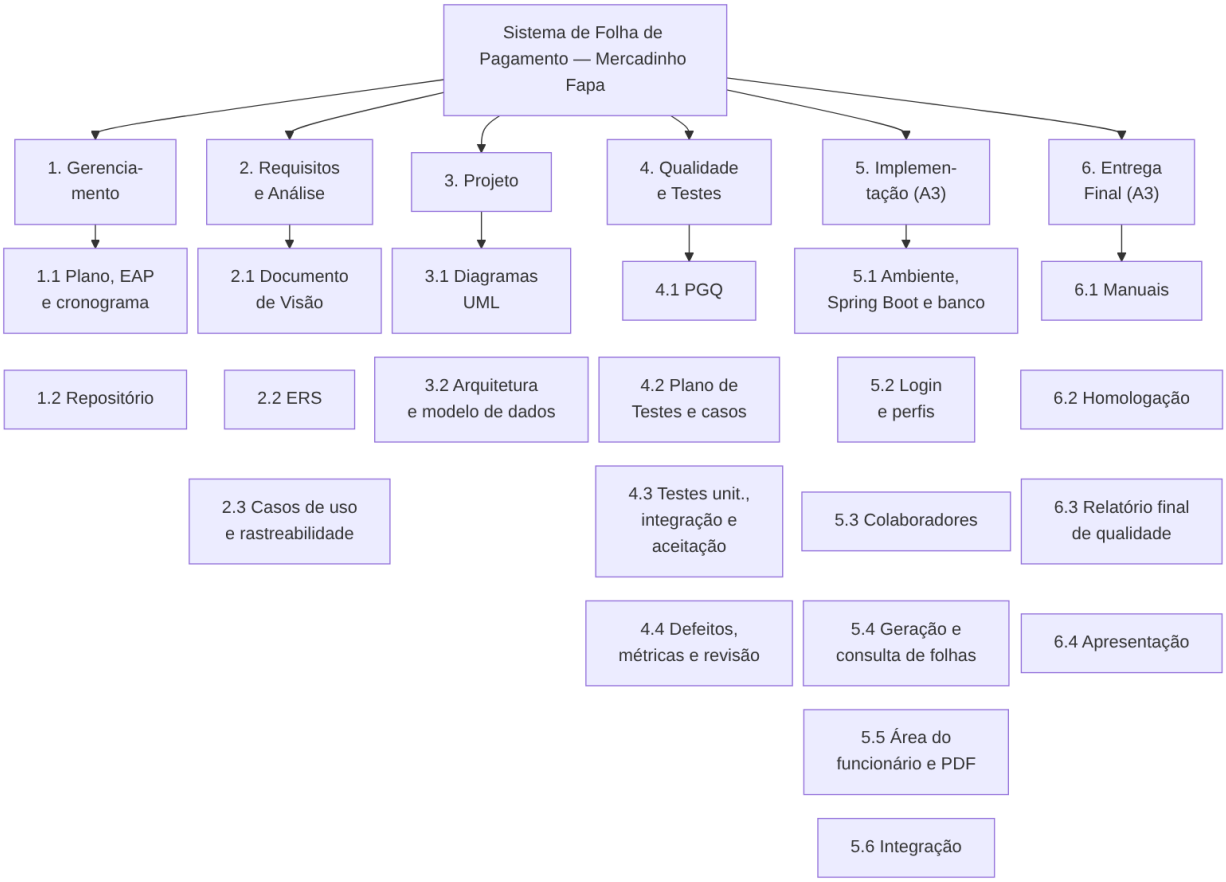



*Figura 1 — EAP do projeto*

## 1.1 Pacotes de trabalho, responsáveis e prazos

| Pacote | Entrega | Responsável | Apoio | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Plano do projeto, EAP e cronograma | Kauã | Equipe | 20/10 |
| 1.2 | Repositório no GitHub com estrutura, README e commits | Kauã | Equipe | 20/10 |
| 2.1 | Documento de Visão | Guilherme | Kauã | 20/10 |
| 2.2 | ERS (RF, RN, RNF, critérios de aceitação, rastreabilidade) | Guilherme | Leo (revisão) | 20/10 |
| 2.3 | Casos de uso e matriz de rastreabilidade | Guilherme | Kauã | 20/10 |
| 3.1 | Diagramas UML | Kauã | Guilherme (revisão) | 20/10 |
| 3.2 | Arquitetura e modelo de dados | Guilherme | Leo (banco) | 20/10 |
| 4.1 | PGQ | Leo | Guilherme | 20/10 |
| 4.2 | Plano de Testes e 40 casos de teste | Leo | Kauã | 20/10 |
| 4.3 | Testes unitários, de integração e de aceitação | Os três | Leo coordena | 17/11 a 22/11 |
| 4.4 | Registro de defeitos, métricas e revisão técnica | Leo | Guilherme | 18/11 a 24/11 |
| 5.1 | Ambiente, projeto Spring Boot e PostgreSQL | Guilherme (projeto) / Leo (banco) | Kauã | 21/10 a 27/10 |
| 5.2 | Login e perfis (Spring Security) | Guilherme | Kauã | 28/10 a 10/11 |
| 5.3 | Colaboradores (RF02 a RF07) | Kauã | Guilherme | 28/10 a 10/11 |
| 5.4 | Geração e consulta de folhas (RF08 a RF10) | Guilherme (geração) / Leo (consulta) | Kauã | 28/10 a 14/11 |

| Pacote | Entrega | Responsável | Apoio | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Área do funcionário (RF11, RF12) e PDF (RF13) | Leo | Guilherme | 28/10 a 10/11 |
| 5.6 | Integração das partes | Os três | Guilherme coordena | 11/11 a 14/11 |
| 6.1 | Manual do usuário e manual técnico | Kauã (usuário) / Guilherme (técnico) | Leo | 20/11 a 27/11 |
| 6.2 | Termo de homologação | Leo | Equipe | 20/11 a 27/11 |
| 6.3 | Relatório final de qualidade | Leo | Kauã | 25/11 a 30/11 |
| 6.4 | Apresentação | Os três | Kauã coordena | 25/11 a 30/11 |

## 2. Cronograma

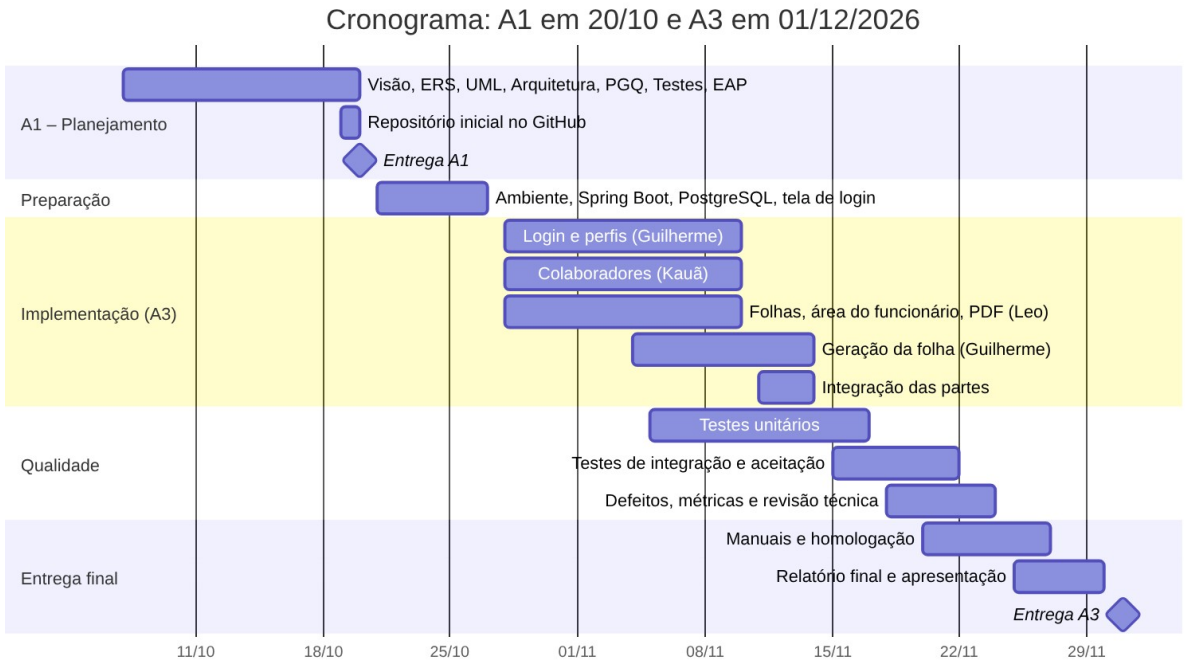



*Figura 2 — Cronograma do projeto (A1 em 20/10 e A3 em 01/12/2026)*

| Período | Atividades | Marco / resultado |
|---|---|---|
| 07/10 a 20/10 | Visão, ERS, UML, arquitetura, PGQ, plano de testes, EAP e repositório inicial. | **Entrega A1 — 20/10** |
| 21/10 a 27/10 | Preparar ambiente (JDK 17, Maven, PostgreSQL, IDE), criar o banco com `schema.sql` e o projeto Spring Boot com a página de login. | Aplicação sobe e conecta ao banco |
| 28/10 a 10/11 | Implementar em paralelo: login e perfis; colaboradores; consulta de folhas, área do funcionário e PDF. Testes unitários desde 05/11. | Cada módulo funciona isolado |
| 04/11 a 14/11 | Geração da folha e integração das partes. | Sistema completo rodando |
| 15/11 a 22/11 | Testes de integração, segurança e aceitação (40 casos). | Resultados registrados |
| 18/11 a 24/11 | Defeitos, regressão, métricas e revisão técnica. | Sem defeitos críticos/altos |
| 20/11 a 27/11 | Manuais e homologação. | Termo de homologação |
| 25/11 a 30/11 | Relatório final de qualidade, apresentação e ensaio. | Material pronto |
| 01/12 | **Entrega A3.** | Sistema, código, testes, manuais e relatório entregues |

**Corte de escopo, se o prazo apertar:** primeiro a exportação em PDF (RF13, prioridade Baixa). O núcleo que não pode ser cortado: login e perfis, cadastro de colaboradores, geração e consulta de folhas e a consulta do

funcionário.

# 3. Distribuição de responsabilidades

## 3.1 Responsabilidades por pessoa

| Integrante | Responsabilidade principal (A3) | Apoio / A1 |
|---|---|---|
| Kauã | Colaboradores: cadastro, consulta, edição, alteração de salário e ativação/inativação (RF02 a RF07) | UML, EAP/cronograma e repositório |
| Guilherme | Base do projeto (Spring Boot), login e perfis com Spring Security (RF01) e geração da folha (RF08, RF09) | Documento de Visão, ERS e Documento de Arquitetura |
| Leo | Consulta de folhas (RF10), área do funcionário (RF11, RF12), PDF (RF13) e scripts do banco | PGQ, Plano de Testes e casos de teste |

Documentação, revisão cruzada de código e organização do repositório são responsabilidade compartilhada dos três. A divisão pode ser ajustada conforme a afinidade técnica, desde que registrada neste documento.

## 3.2 Quem desenvolve cada requisito

| Requisitos | Responsável |
|---|---|
| RF01 Login e perfis; RF08 e RF09 Registro e geração da folha | Guilherme |
| RF02 a RF07 Colaboradores (cadastro, consulta, edição, salário, ativação/inativação) | Kauã |
| RF10 Consulta de folhas; RF11 e RF12 Área do funcionário; RF13 PDF; scripts do banco | Leo |
